




# 金沢外環状道路 海側幹線 IV期区間

## 1. 今年度の進捗状況

- ・測量：路線測量概ね完了
- ・地質調査：道路設計用、橋梁予備設計用のボーリングは概ね完了
- ・設計：道路詳細設計、橋梁予備設計中

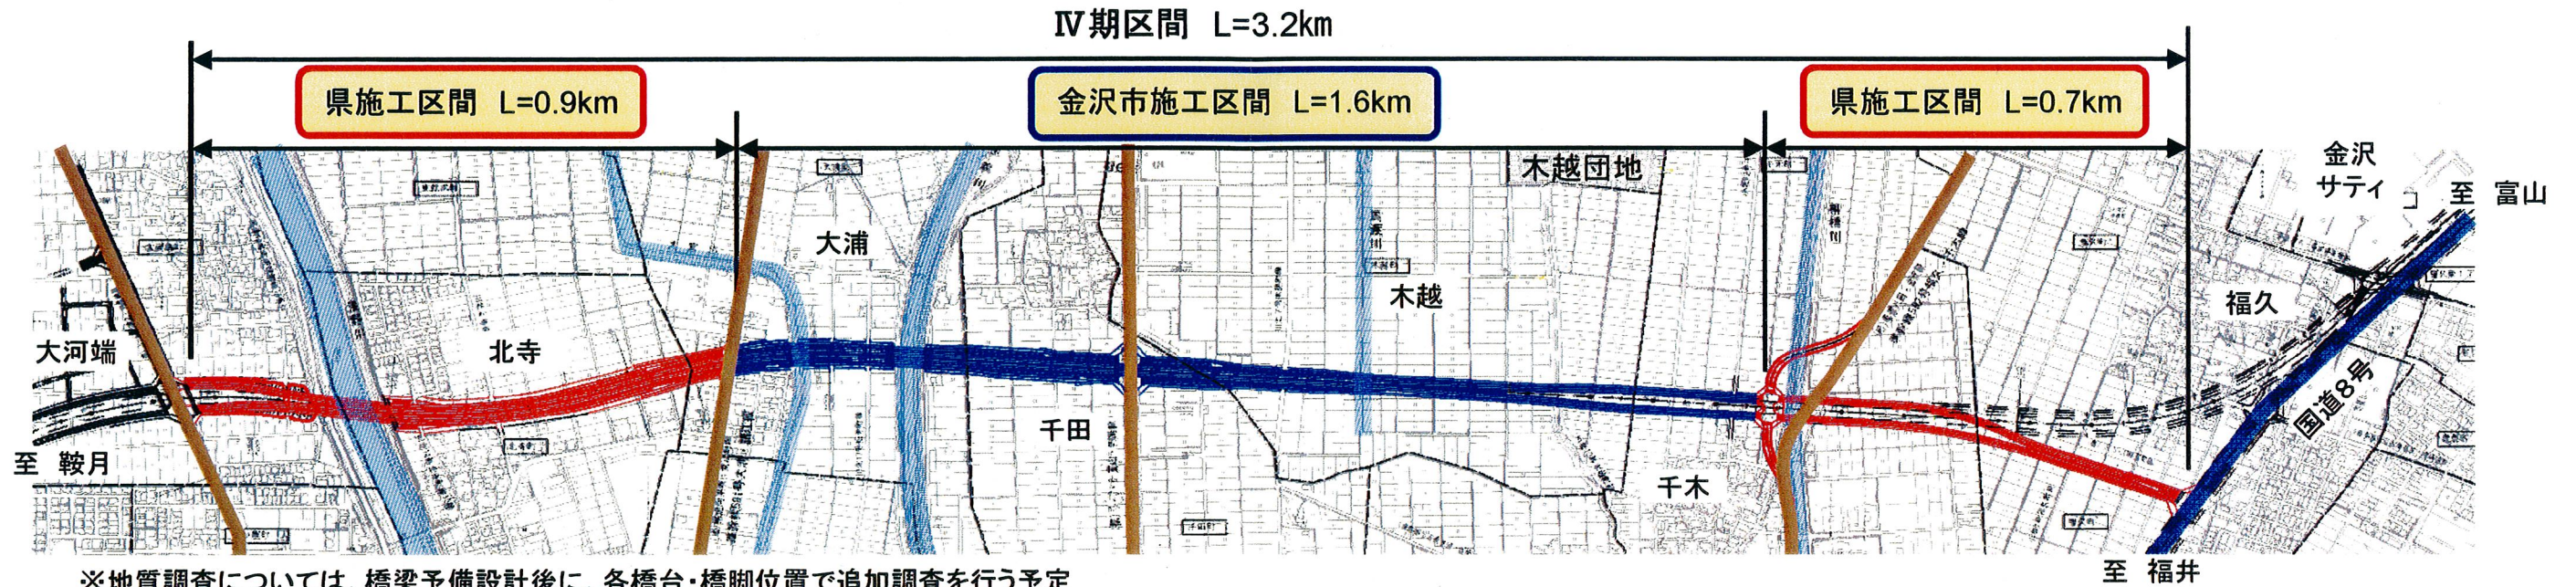

## 2. 今後の対応

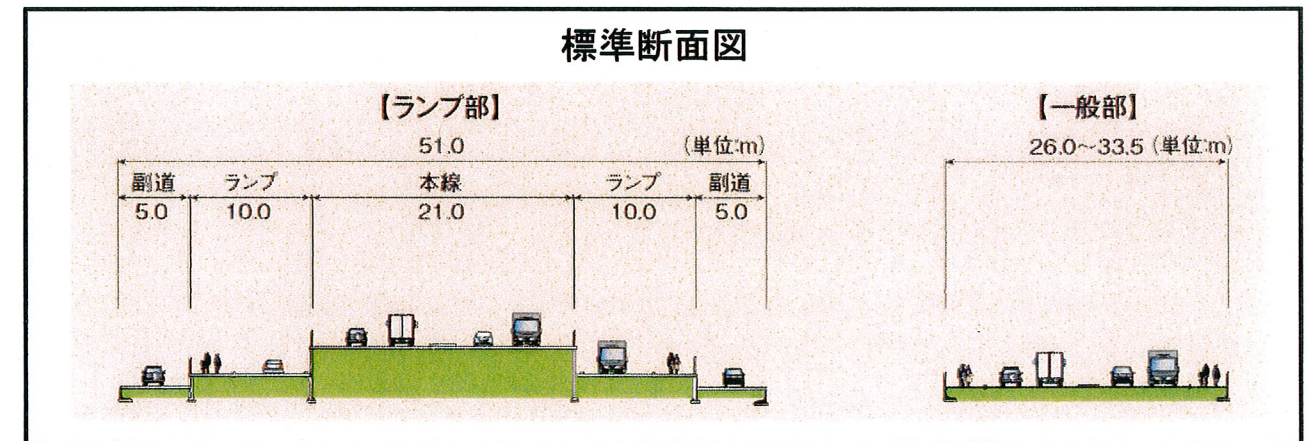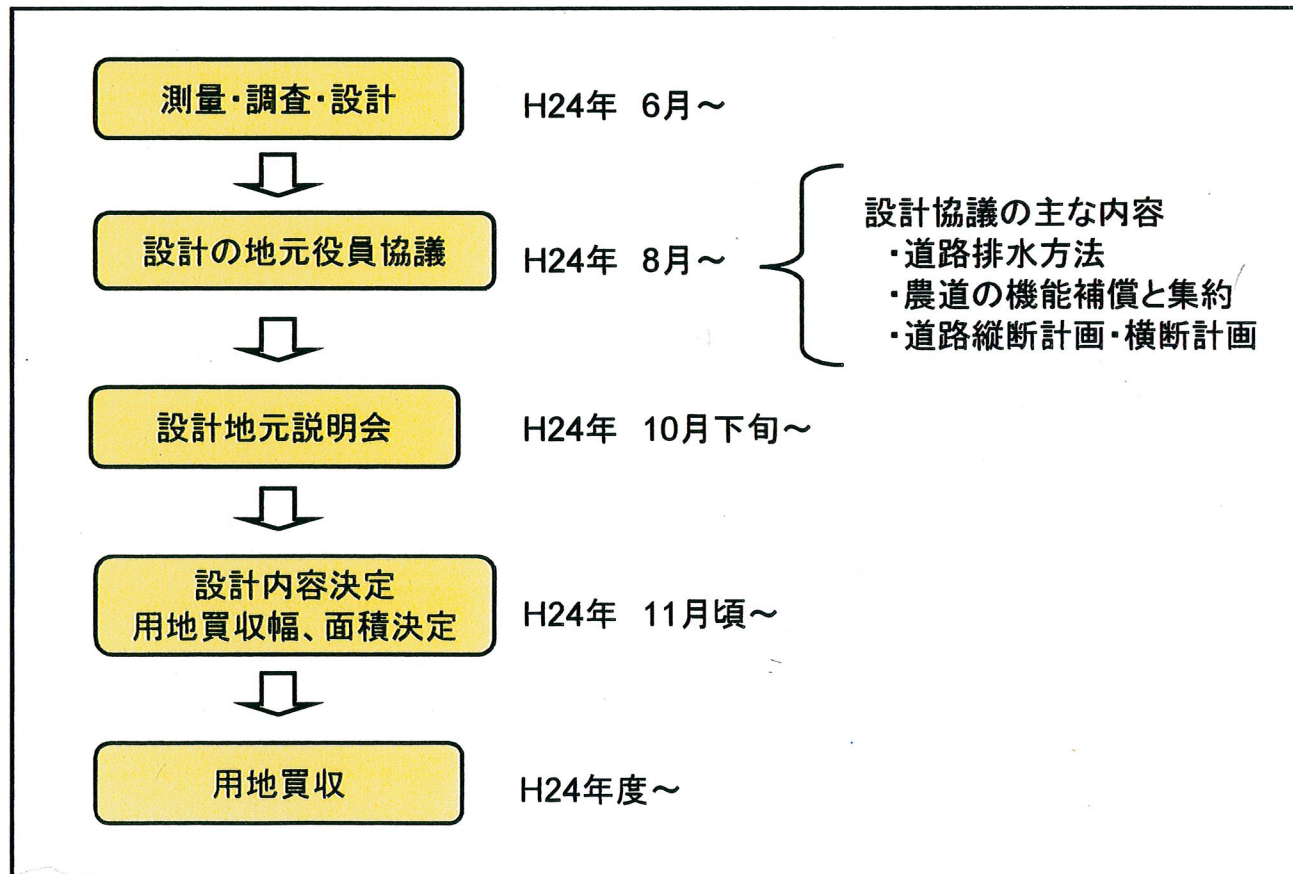

### ◎概略スケジュール

		平成24年度	平成25年度
石川県	測量・設計	■	
	用地買収		■
金沢市	測量・設計	■	
	用地買収		■

※用地買収の完了時期は未定
