

# 金沢C-BOX工事概要説明書

工種	月 日 曜日	H25年7月										H25年8月										H25年9月			備考																		
		22 月	23 火	24 水	25 木	26 金	27 土	28 日	29 月	30 火	31 水	1 木	2 金	3 土	4 日	5 月	6 火	7 水	8 木	9 金	10 土	11 日	12 月	13 火		14 水	15 木	16 金	17 土	18 日	19 月	20 火	21 水	22 木	23 金	24 土	25 日	26 月	27 火	28 水	29 木	30 金	31 土
準備工		雑工（立入防止柵撤去・整地）										迂回路舗装・仮囲い設置										雑工（立入防止柵復旧）																					
断面修復工												断面修復工																															
ひび割れ補修工																						ひび割れ補修工																					
はく落防止対策工												WJ表面処理										はく落防止対策工																					
(BOX内通行止期間)												通行止										通行止																					

工事名：北陸自動車道 金沢管内コンクリート補修工事(平成24年度)  
 工期：平成25年4月5日～平成27年2月23日  
 発注者：中日本高速道路(株)金沢支社  
 施工者：砺波工業株式会社  
 現場代理人：地守 誠  
 連絡先 工事事務所 076-240-3750  
 現場代理人携帯 090-5689-2890  
 施工概算数量  
 断面修復工 1039 千cm<sup>3</sup>  
 ひび割れ補修工 34.6 m<sup>2</sup>  
 はく落防止対策工 456.5 m<sup>2</sup>  
 線導水工 6.1 m  
 雑工 1 式

**工事内容**  
 ボックス天井部からコンクリート片が落ちてこないように既設ボックスカルバートの損傷部の補修を行ったあとに、はく落予防の塗装を行い、皆様方の通行の安全を確保するために行うものです。

施工箇所写真



市街地より国道8号線方を望む



国道8号線より市街地方を望む

施工箇所位置図





# 施工時の仮設備概要





8号線側



市街地側

1. 既設ボックス内は通行止めとします。
2. NEXCO敷地内に迂回道路（幅3.0m、アスファルト舗装）を設置します。
3. 作業時間は原則8:30~17:00とします。
4. 工事用車両が出入りする時には、交通誘導員を配置します。
5. 8月14~8月18日は作業休止とします。
6. 夜間工事は行いません。

迂回道路概要図

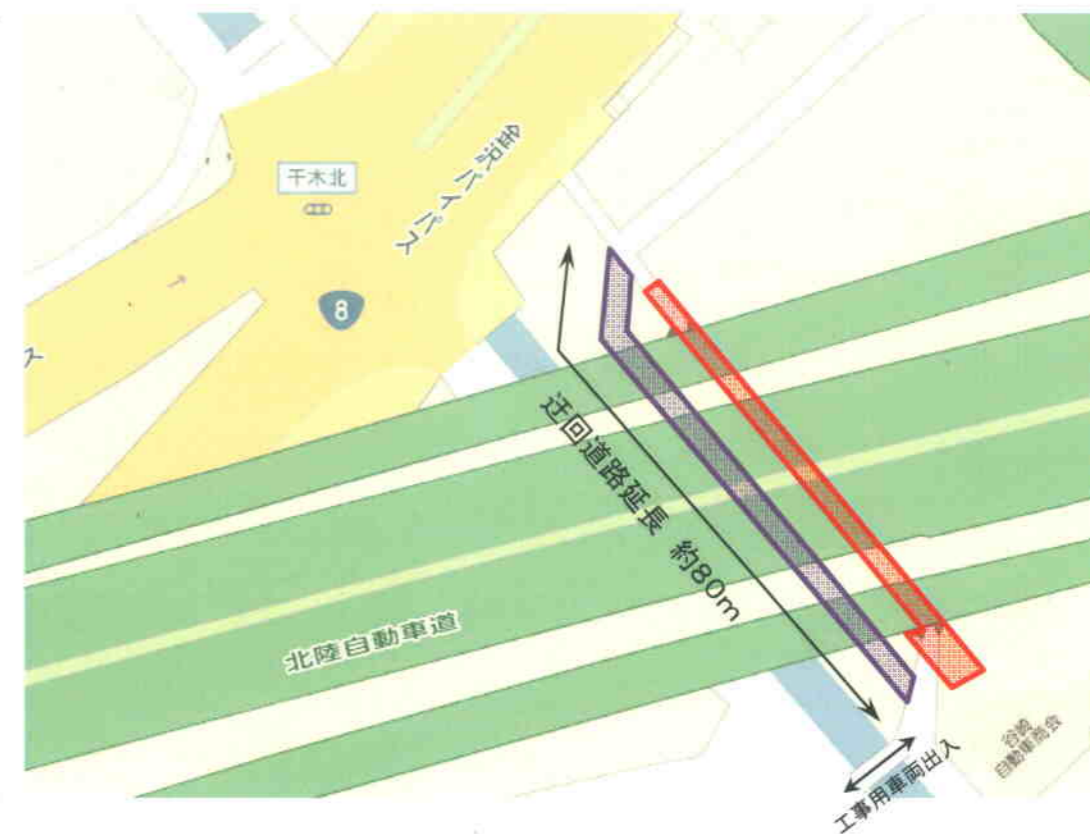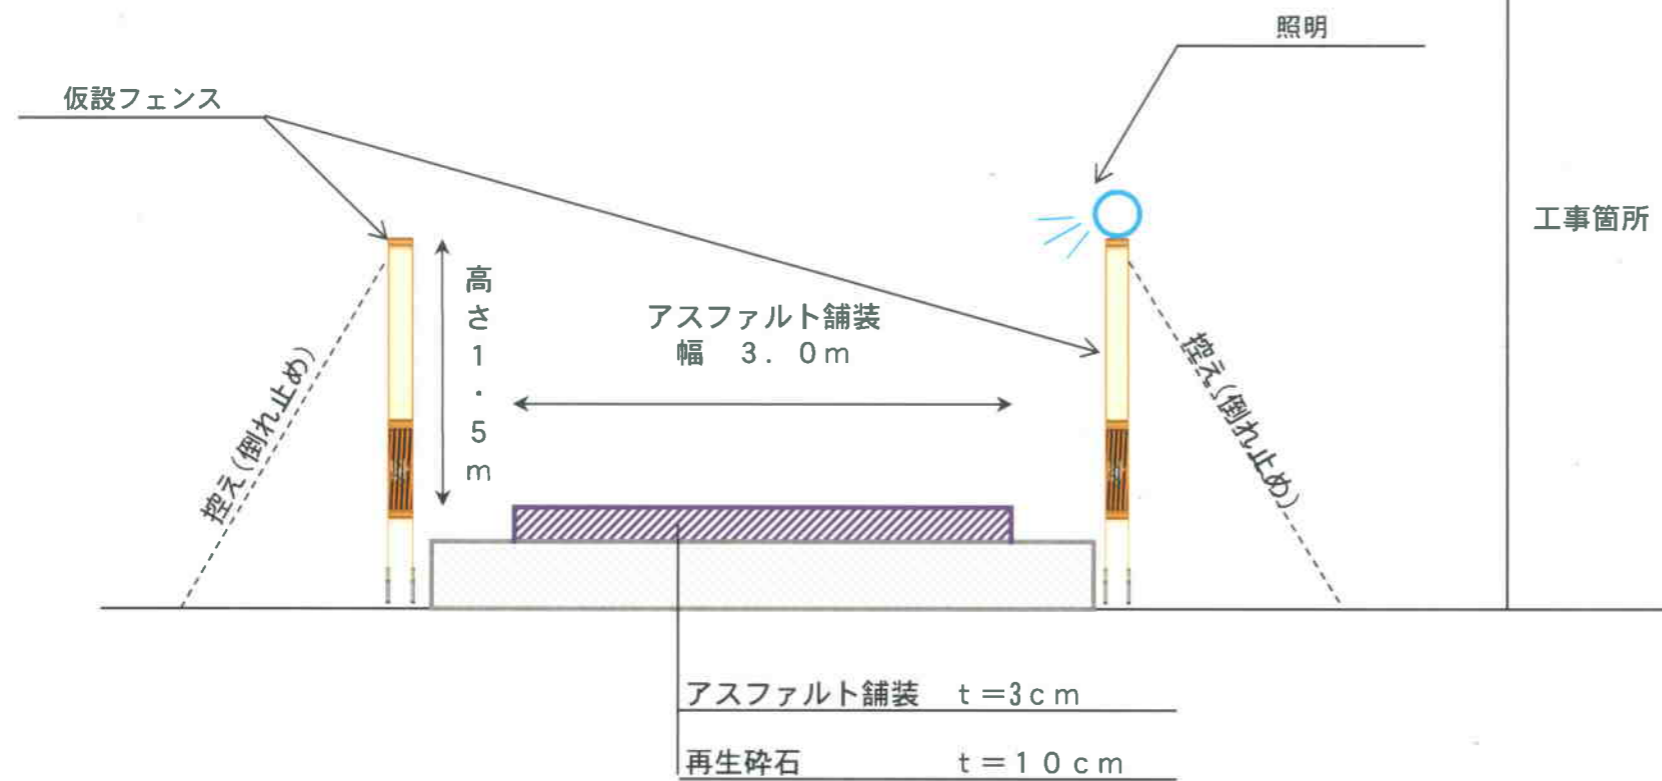

- 凡例
- 工事作業箇所 (通行止)
  - 迂回道路
